



RAPPORT DE VERIFICATION REGLEMENTAIRE CTS (CTS 34)

Vérification Réglementaire CTS (CTS 34)

CHAPITEAU 69-151



N° de rapport : C24091051 / T240248373
Date : 12 juin 2024

Accréditation n° 3-2017 – Inspection Liste des sites
et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Lieu d'intervention : TANUS – La Crouzié

Contact : Léna HAMDADOU

Destinataire rapport : Léna
HAMDADOU

@ : deboutlesyeux@gmail.com

Date d'intervention :
du 12/06/2024

Intervenant : **Jean-baptiste SIMIAND**

Signature



Ce rapport comporte 10 pages Choisissez un bloc de construction.RefNomadd - v0

« Lieu d'intervention » : TANUS lieu dit La Crouzié

« Date d'intervention » : 12/06/2024

« RAISON SOCIALE APAVE »

Agence de TOULOUSE
11 rue Alexis de Tocqueville
31200 TOULOUSE
Tél. : **05.61.37.62.62**

« ADRESSE PROPRIETAIRE »

ASSOCIATION DEBOUT LES YEUX
La Crouzié
81190 TANUS

**RAPPORT DE VÉRIFICATION REGLEMENTAIRE CTS
(CTS 34)**

Ce rapport annule et remplace toute version antérieure de la vérification réglementaire

**Numéro
d'identification du CTS:**
n° 69-151



Accompagné par :
« Propriétaire ou de son représentant »
Léna HAMDADOU

Bureau de Vérification CTS Apave
Jean-baptiste SIMIAND

Accréditation COFRAC n°3-2017
(Liste des sites et portées disponibles sur
www.cofrac.fr)



Signature :

SOMMAIRE

1	AVIS DU VERIFICATEUR ET SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS	4
2	GENERALITES	4
2.1	Objectif de la vérification technique	4
2.2	Références réglementaires	4
2.3	Périmètre de la prestation	4
2.4	Locaux, structures ou équipements non visités	4
2.5	Commentaires relatifs au déroulement de la prestation	5
2.6	Configuration et exploitation de l'établissement.....	5
2.7	Périodicité	5
2.8	Modifications depuis les précédentes vérifications	5
2.9	Registre de sécurité	5
3	DESCRIPTION DE L' ETABLISSEMENT EXAMINE.....	5
3.1	Caractéristiques de l'établissement.....	5
3.2	Renseignements concernant l'établissement.....	5
4	CONSTAT ET OBSERVATIONS.....	6
4.1	Toile :	6
4.2	Structure – Ossature :	6
4.3	Éléments de liaisonnement au sol :	7
4.4	Équipements et aménagements :	8
4.5	Dispositifs de traction	8
5	ALBUM PHOTOS.....	8
6	PIECES JOINTES	10

1 AVIS DU VERIFICATEUR ET SYNTHESE DES OBSERVATIONS

- L'état de conservation des ossatures et des toiles est satisfaisant et nous portons un avis FAVORABLE sur le maintien en exploitation pour les 2 années à venir, du CTS visé sous réserve du traitement des remarques ci-après :

N° Obs	Identification	Observations
01	Issues de secours	Absence de marquage « ISSUE DE SECOURS » côté extérieur sur les bâches de sorties
02	Registre de sécurité	La mutation du registre de sécurité doit être réalisée au nom de l'actuel propriétaire
		Les tribunes figurées sur le rapport CTS 3 du cabinet ATH, n'ont pas été rachetées par l'actuel propriétaire et n'ont pas été vérifiées

2 GENERALITES

2.1 OBJECTIF DE LA VERIFICATION TECHNIQUE

Vérification technique périodique des Chapiteaux, Tentes et Structures.

La prestation a pour objectif de vérifier, l'état général de tout ou partie des éléments de l'établissement afin de déceler des anomalies graves susceptibles de créer une situation dangereuse pour les personnes de nature à entraîner le retrait du registre de sécurité.

Examen :

- Etat de conservation :
 - Toiles, portiques, mâts, ossatures, mécanismes, fixations, etc.
 - Equipements structurels « permanents » déclarés dans le registre (Tribunes, podiums, grill, ..)
 - Dispositifs « permanents » assurant la stabilité (haubans, moyens d'ancrage, équipements de traction).

Nota :

Les équipements techniques (chauffage, électricité, SSI, ...) ne font pas partie des vérifications dans le cadre de l'application du CTS 34 ou CTS 79 et font l'objet de vérifications périodiques spécifiques.

Les éléments constituant le CTS, structure, toile et équipements permanents peuvent être vérifiés montés ou au sol.

Base documentaire pour la réalisation de la vérification

- Examen de l'adéquation du matériel objet de la vérification et du Registre du CTS.
Nota : Le Registre sera visé en fin de prestation par le vérificateur technique CTS. (Inscription de la vérification périodique)

2.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Réglementation CTS arrêté du 23 janvier 1985 modifié

2.3 PERIMETRE DE LA PRESTATION

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

2.4 LOCAUX, STRUCTURES OU EQUIPEMENTS NON VISITES

Les parties d'établissement qui n'ont pas pu être visitées sont récapitulées avec les motifs dans le tableau ci-dessous :

Localisation	Parties d'établissement	Motifs
Sans objet	-	-

2.5 COMMENTAIRES RELATIFS AU DEROULEMENT DE LA PRESTATION

Présentation de l'établissement vérifié	Monté	Démonté	Observations
	X		

Nota : Ces vérifications peuvent être réalisées quand l'établissement est démonté. Dans ce cas, le matériel est contrôlé au sol.

2.6 CONFIGURATION ET EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT

Configuration de l'établissement : ☒ sans étage ☐ à étage

Utilisation de l'établissement : ☒ itinérant ☐ fixe par conception ☐ à implantation prolongée (> 6mois)

2.7 PERIODICITE

☒ Tous les 2 ans

Nota : Pour les établissements à étage et à implantation prolongée, une visite complémentaire semestrielle relatif à la stabilité et liaisonnement au sol est nécessaire (CTS79).

2.8 MODIFICATIONS DEPUIS LES PRECEDENTES VERIFICATIONS

(Portées à notre connaissance)

☐ Oui ☒ Non

(Si oui, préciser) :

Modification	Date	Commentaires

L'établissement a fait l'objet d'un incident depuis notre dernière visite

☐ Oui ☒ Non

Commentaires :

Incident	Date	Commentaires

2.9 REGISTRE DE SECURITE

☐ Présenté ☒ Non présenté

Identification	Date	Organismes	Commentaires
Registre de sécurité	09/11/2005	BVCTS - ATH	Pas d'équipement technique (électricité , chauffage, etc.) ou équipement (tribune etc.) mentionné à l'extrait de registre

3 DESCRIPTION DE L' ETABLISSEMENT EXAMINE

3.1 CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT

Propriétaire: ASSOCIATION DEBOUT LES YEUX

Adresse: lieu dit La Crouzié

Code postal : 81190

Ville : TANUS

3.2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT

Module de base / Dimensions : 17x23m Dimension présentée : 382m²

Fabricant : Structure : MASSON Toiles : ALBAN&FILS / Serge FERRARI

Coloris : Jaune/rouge Entourage : Jaune/rouge

Toit : Jaune/rouge

4 CONSTAT ET OBSERVATIONS

4.1 TOILE :

Etat général de conservation :

☒ **S** satisfaisant ☐ **NS** non satisfaisant ☐ **NV** non vérifié ☐ **SO** sans objet

Identification	Localisation	Commentaires	Avis
Numéro d'identification (Figure/ ne figure pas)			S
Issues matérialisées		Issues non matérialisées côté extérieur	NS
Aspect extérieur			S
Etat de vétusté			S
Etats des joncs			S
Etat des soudures			S
Etat des coutures			S
Barre de tension de toile			S
Etat des Œillets, lacets			S

4.2 STRUCTURE – OSSATURE :

Tentes et Structures

Etat général de conservation :

☒ **S** satisfaisant ☐ **NS** non satisfaisant ☐ **NV** non vérifié ☐ **SO** sans objet

Identification	Localisation	Commentaires	Avis
Numéro d'identification (Figure/ ne figure pas)			
Poteaux			
Demi-fermes			
Demi-lunes			
Poteaux pignon			
Traverses			
Bracons (ou contrefiches)			
Pannes (ou fermes) intermédiaires			
Pannes (ou fermes) faîtières			
Pannes (ou ferme) sablières			
Câbles de contreventement			

Chapiteaux

Etat général de conservation :

☐ **S** satisfaisant ☐ **NS** non satisfaisant ☐ **NV** non vérifié ☒ **SO** sans objet

Identification	Localisation	Commentaires	Avis
Mâts en ligne		Nb de poteaux 2 Nb de traverses	S
Mâts au carré		Nb	SO
Arceaux		Nb	SO
Platines d'ancrage		Nb : 2	S
Ancrage		Dimension(s) des pinces : non examiné (pinces enfoncées dans le sol)	NV
Coupole			S
Couronne			S
Vergue			S
Poteaux de corniche			S
Poteaux de tour			S
Corde de tour			S
Corde d'entourage			S
Câbles de contreventement			S

4.3 ELEMENTS DE LIAISONNEMENT AU SOL :

Etat général de conservation des dispositifs permanents :

☒ **S** satisfaisant ☐ **NS** non satisfaisant ☐ **NV** non vérifié ☐ **SO** sans objet

Identification	Localisation	Commentaires	Avis
Ancrage		<i>PINCES (têtes visibles uniquement, car CTS monté)</i> <i>NOTA : liaisonnement au sol non vérifié dans le cadre de la mission CTS34</i>	S
Lestage			SO
Haubanage – Sangles - Câbles		Haubans sangles à cliquets sur poteaux de tour	S
Calage			SO

4.4 EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS :

Etat général de conservation des équipements permanents :

☐ **S** satisfaisant ☐ **NS** non satisfaisant ☐ **NV** non vérifié ☒ **SO** sans objet

Identification	Localisation	Commentaires	Avis
Entourage rigide : – composition – classement – accrochage			SO
Plancher flottant			SO
Equipements permanents Tribunes, gradins		GRADINS NON RACHETES PAR L'ACTUEL PROPRIETAIRE	SO


4.5 DISPOSITIFS DE TRACTION

Etat général de conservation des dispositifs permanents :

☐ **S** satisfaisant ☐ **NS** non satisfaisant ☐ **NV** non vérifié ☒ **SO** sans objet

Identification	Localisation	Commentaires	Avis
Appareillages de traction		« Type de tirefort hydraulique, mécanique, référence, marquage du diamètre du câble et effort de traction » 2 TIREFORTS : VGP en cours de validité réalisée en 2024 par CLIN D'ŒIL CONTROLE	S
haubans			S

5 ALBUM PHOTOS

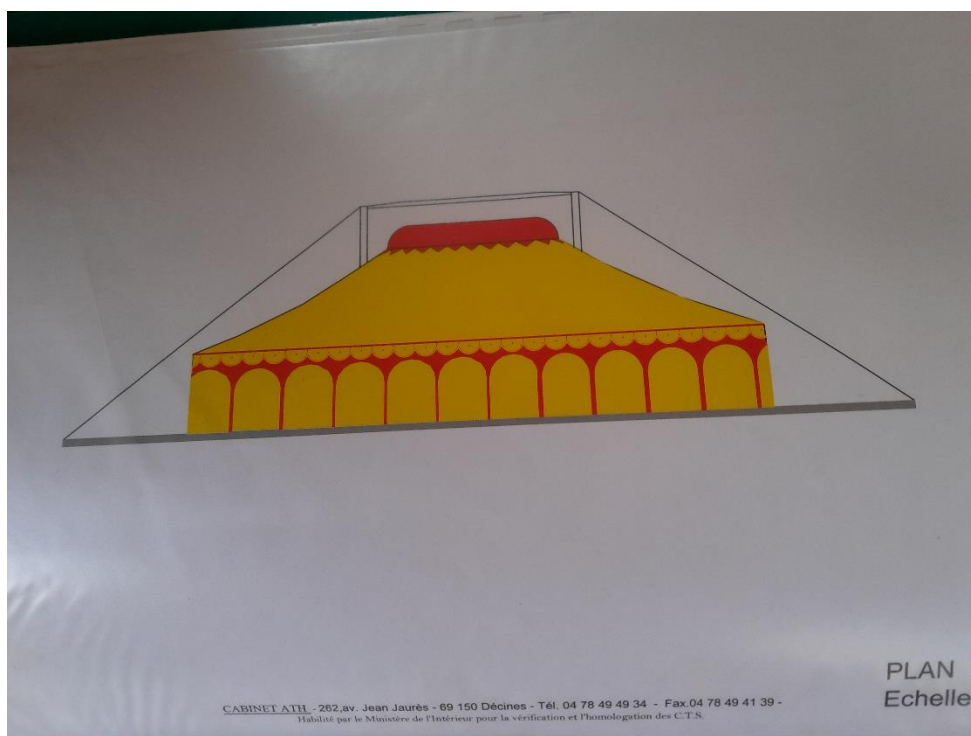





6 PIECES JOINTES

Sans objet
